



**H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS.**

**ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS.**

**CONTRATO NO. IS-MXL-REPUVE-041-2023 T-REPUVE-2022-014**

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., A LAS 09:30 HORAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, Y EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 64 PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO EN VIGOR; SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON MOTIVO DE FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:

**"REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. OCOTLÁN ENTRE BLVR. VILLAFONTANA Y C. PASEO DE SAN MARCOS, COL. SAN MARCOS, MEXICALI, B. C."**

LOS CUALES CONSISTIERON EN **PRELIMINARES, PAVIMENTACIÓN, OBRA COMPLEMENTARIA, SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y OBRA EXTRAORDINARIA.** MISMOS QUE FUERON EJECUTADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO **IS-MXL-REPUVE-041-2023 T-REPUVE-2022-014,** POR **ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

**I.- DATOS DEL CONTRATO:**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 1.- IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.    | \$ 4,851,695.68         |
| 2.- IMPORTE TOTAL CONVENIDO CON I.V.A. | \$ 4,851,695.68         |
| 3.- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL     | 30 DIAS NATURALES       |
| 4.- FECHA DE INICIO CONTRACTUAL        | 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| 5.- FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL   | 02 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 6.- PLAZO DE EJECUCION CONVENIDA       | 40 DIAS NATURALES       |
| 7.- FECHA DE INICIO CONVENIDA          | 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| 8.- FECHA DE TERMINACION CONVENIDA     | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| 9.- PLAZO DE EJECUCIÓN REAL            | 46 DIAS NATURALES       |
| 10.- FECHA DE INICIO REAL              | 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| 11.- FECHA DE TERMINACIÓN REAL         | 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |



## II.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

| A. Preliminares.   | UNIDAD | CANTIDAD |
|--|--------|----------|
| Fresado de carpeta asfáltica   | M3     | 391.25   |
| Acarreo en kilómetros subsecuentes al primero de material producto del fresado | M3/KM  | 970.30   |
| Limpieza y desazolve de boca de tormenta.                                      | PZA    | 12       |
| Limpieza y desazolve de pozos.   | PZA    | 13       |
| Limpieza y desazolve de válvula.   | PZA    | 7        |
| Retiro de señal vial instalada   | PZA    | 16       |
| Instalación de letrero de obra   | PZA    | 1        |
|  |        |          |
| B. Pavimentación.  |        |          |
| Riego de liga.   | M2     | 7,825.06 |
| Suministro y colocación de carpeta de 5.00 cm.                                 | M2     | 7,825.06 |
|  |        |          |
| C. Obra complementaria.  |        |          |
| Reconstrucción de anillo de concreto para brocal 36".                          | PZA    | 10       |
| Reconstrucción de anillo de concreto para brocal 24".                          | PZA    | 3        |
| Reconstrucción de cuadro de concreto en válvulas.                              | PZA    | 7        |
| Reconstrucción de anillo en boca de tormenta.                                  | PZA    | 12       |
| Suministro y colocación de tapa y brocal en pozos 36".                         | PZA    | 10       |
| Suministro y colocación de tapa y brocal en pozos 24".                         | PZA    | 3        |
| Suministro y colocación de tapa y brocal en válvulas 14".                      | PZA    | 7        |
| Suministro y colocación de marco y rejilla para boca de tormenta.              | PZA    | 12       |
| Traslado de placas metálicas.  | PZA    | 5        |
| Uso de placas metálicas.   | PZA    | 15       |
|  |        |          |
| D. Señalamiento vial.  |        |          |
| Suministro y colocación de señal de alto con nomenclatura.                     | PZA    | 14       |
| Suministro y colocación de señal de límite máximo de velocidad.                | PZA    | 5        |
| Suministro y colocación de señal de ceda el paso.                              | PZA    | 2        |
| Suministro y colocación de señal de prohibido el paso de vehículos pesados.    | PZA    | 5        |
| Suministro y colocación de señal de obstáculo o bifurcación.                   | PZA    | 5        |
| Suministro y aplicación de línea de 10 cm.                                     | M      | 922.70   |



|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Suministro y aplicación de línea de 40 cm.                      | M       | 92     |
| Suministro y aplicación de línea de 40 cm (cruce de peatones).  | M       | 730.10 |
| Suministro y aplicación de línea de 20 cm (zona neutral).       | M       | 387.52 |
| Suministro y aplicación de flechas y leyendas.                  | PZA     | 49     |
| Suministro y colocación de vialeta provisional.                 | PZA     | 10     |
| Suministro y colocación de vialeta de una cara.                 | PZA     | 130    |
| Suministro y colocación de vialeta de dos caras.                | PZA     | 1,025  |
| Suministro y colocación de estoperoles.                         | PZA     | 60     |
| <b>E. Señalamiento de protección de obra.</b>                   |         |        |
| Renta de delineador.  | PZA     | 38.57  |
| Renta de cinta de hule amarilla.                                | M/SEM   | 171.43 |
| Renta de flecha secuencial                                      | JORNADA | 6      |
| <b>F. Obra extraordinaria.</b>                                  |         |        |
| Suministro y colocación de boyas metálicas.                     | PZA     | 669    |
| Suministro y colocación de señal de prohibido seguir de frente. | PZA     | 2      |
| Suministro y colocación de señal de estrechamiento asimétrico.  | PZA     | 2      |

III.- RELACION DE ESTIMACIONES:

| No. DE ESTIMACION | PERIODO DE EJECUCION                                    | IMPORTE SIN I.V.A. | I.V.A.        | IMPORTE TOTAL   |
|-------------------|---|--------------------|---------------|-----------------|
| 1                 | 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023<br>AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | \$ 2,540,675.79    | \$ 406,508.13 | \$ 2,947,183.92 |
| 2 (FINIQUITO)     | 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023<br>AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 | \$ 1,533,390.58    | \$ 245,342.49 | \$ 1,778,733.07 |
|                   | TOTAL   | \$ 4,074,066.37    | \$ 651,850.62 | \$ 4,725,916.99 |



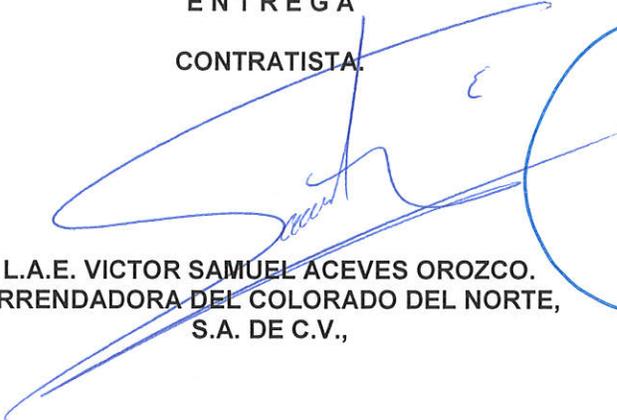
EN ESTE ACTO, EL L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE OBRA TERMINADA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 166, FRACCION VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO EN VIGOR, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA FIANZA No. 2252780 EMITIDA POR CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

EN VISTA DE LO ANTERIORMENTE CONSIGNADO, ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO, HACE ENTREGA AL ING. ALBERTO IBARRA OJEDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, LOS TRABAJOS ANTERIORMENTE DESCRITOS.

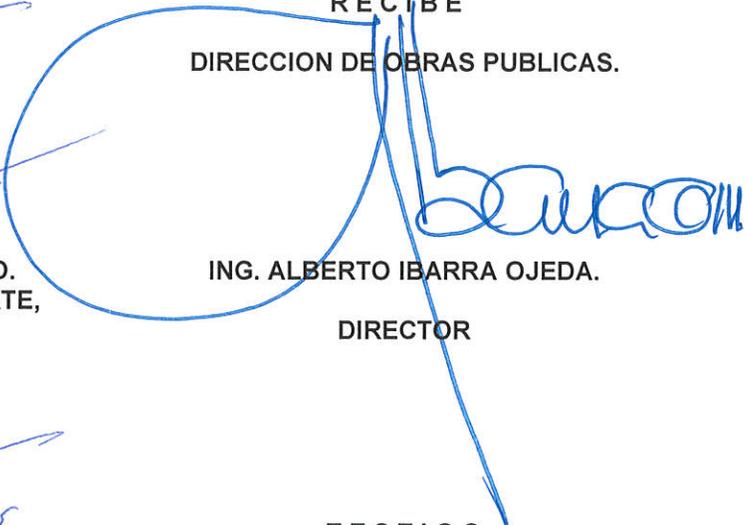
PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

ENTREGA  
CONTRATISTA.

  
L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO.  
ARRENDADORA DEL COLORADO DEL NORTE,  
S.A. DE C.V.,

RECIBE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

  
ING. ALBERTO IBARRA OJEDA.  
DIRECTOR

TESTIGO

  
L.A.E. VICTOR SAMUEL ACEVES OROZCO.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA.

TESTIGO

  
ING. RAFAEL ANTONIO GARCIA PIO.  
RESIDENTE DE OBRA.
