



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-002-2025 T-REPUVE-2024-05

En la ciudad de Mexicali, B.C., a las 10:00 horas del día 14 de julio de 2025, y en base a lo establecido en los Artículos 64 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento en vigor; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción física de los trabajos denominados:

“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE CUYAMACA, MEXICALI, B.C.”,

Los cuales consistieron principalmente en preliminares, pavimentación, obra complementaria, señalamiento vial, señalamiento de protección de obra, así mismo fueron ejecutados al amparo del Contrato de Obra Pública número **LP-MXL-REPUVE-002-2025 T-REPUVE-2024-05**, por Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.

I.- DATOS DEL CONTRATO:

1.- Importe del contrato con I.V.A	\$ 17,498,656.90 IVA
2.- Plazo de ejecución contractual	75 días naturales
3.- Fecha de inicio contractual	14 de abril de 2025
4.- Fecha de terminación contractual	27 de junio de 2025
5.-Plazo de ejecución convenido	82 días naturales
6.- Fecha de inicio real	14 de abril de 2025
7.- Fecha de terminación real	04 de julio de 2025



II.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
A	PRELIMINARES		
A 01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, ARMADO, TABIQUE Y/O MAMPOSTERÍA EN DIFERENTES ESPESORES CON EQUIPO MECÁNICO, DE ELEMENTOS TALES COMO CORDONES, BANQUETAS, CUNETAS.	M3	55.83
A 02	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICIONES A BANCO DE TIRO AUTORIZADO EN EL EJIDO HIPÓLITO RENTERÍA.	M3 KM	1,329.87
A 03	PERFILADO DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 7 CM DE ESPESOR, CON CORTADORA DE DISCO.	M	485.25
A 04	RUPTURA DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CON EQUIPO MECÁNICO. INCLUYE: DEMOLICIÓN, EXTRACCIÓN, CARGA.	M3	10.06
A 05	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL DE BASE HIDRÁULICA COMPACTADO, DE 0.0 A 0.50 M DE PROFUNDIDAD, PARA ALOJAR GUARNICIÓN.	M3	64.11
A 06	BACHEO DE PAVIMENTO EN FRANJA ALEDAÑA A GUARNICIÓN, INCLUYE: COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA; CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA.	M2	49.98
A 07	FRESADO CON EQUIPO MECÁNICO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE (VOLUMEN COMPACTO). INCLUYE PERFILADO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO EN SU PRIMER KILÓMETRO.	M3	1,598.14
A 08	ACARREO EN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DEL FRESADO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO.	M3 KM	8,438.42
A 09	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCA DE TORMENTA EXISTENTE, INCLUYE: RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE REJILLA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA MANUAL O CON EQUIPO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA.	PZA	5.00
A 11	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA MANUAL, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA A BANCO DE TIRO AUTORIZADO.	PZA	2.00
A 12	RETIRO DE SEÑAL VIAL INSTALADA, DE TIPO Y DIMENSIONES DIVERSAS, INCLUYE: CARGA, ACARREO, ENTREGA EN LOS PATIOS DE LA DEPENDENCIA EN EL EX-EJIDO ZACATECAS, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	9.00
A 13	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR; COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA; BARRIDO Y RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2.	M2	2,154.50

2



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA
CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-002-2025 T-REPUVE-2024-05

A 14	BACHEO PROFUNDO DE PAVIMENTO, INCLUYE: CORTE, PERFILADO Y DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR; EXCAVACIÓN EN UN ESPESOR DE HASTA 30 CM; COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA; CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN UN ESPESOR COMPACTO DE 30 CM.	M2	351.84
A 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 4'x8', INCLUYE: IMPRESIÓN DIGITALIZADA 4'x8', HOJA DE TABLACEL CON DOS CARAS DE MELAMINA BLANCA DE 3/4"x4'x8'.	PZA	1.00
B PAVIMENTACIÓN			
B 01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-60 EN PROPORCIÓN DE 0.50 LT/M2. INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, CALENTAMIENTO.	M2	33,572.17
B 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON MEZCLA ELABORADA EN PLANTA Y EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO TRITURADO DE TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO TIPO I, GRADO PG 76-22. INCLUYE: SUMINISTROS, ELABORACIÓN.	M2	33,572.17
C OBRA COMPLEMENTARIA			
C 02	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA BROCAL DE 24"Ø, DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c=250 KG/CM2, CON MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE 1/2"-3/4" EN PROP. DE 300 GR/M3 Y ACELERANTE INTEGRADO A 3 DÍAS.	PZA	3.00
C 03	RECONSTRUCCIÓN DE CUADRO DE CONCRETO DE 85x85x20 CM PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE 4" A 12"Ø, INCLUYE: CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA, SUMINISTRO.	PZA	2.00
C 04	RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL EN BOCA DE TORMENTA, INCLUYE: CORTE DE CARPETA CON DISCO, PERFILADO, DEMOLICIÓN DE ANILLO DE CONCRETO EXISTENTE, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO CON 3 VARILLAS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS 1/4" DE DIÁMETRO @15 CM.	PZA	5.00
C 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 24"Ø DE FoFo, PARA POZO DE VISITA DE DRENAJE SANITARIO O PLUVIAL.	PZA	3.00
C 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE BROCAL Y TAPA DE 14"Ø DE CONCRETO POLIMÉRICO, PARA REGISTRO DE VÁLVULA DE AGUA POTABLE.	PZA	2.00
C 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE MARCO Y REJILLA DE FoFo PARA BOCA DE TORMENTA DE DRENAJE PLUVIAL.	PZA	5.00
C 09	TRASLADO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS DE POZOS DE VISITA, REGISTROS DE VÁLVULAS Y BOCAS DE TORMENTA.	PZA	4.00
C 10	USO DE PLACA METÁLICA DE 2.44x2.44 m DE 3/4" DE ESPESOR PARA HABILITACIÓN DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREAS SOLICITADAS POR SUPERVISIÓN.	PZA	7.00
C 11	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" DE 70 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL f'c=200 KG/CM2. INCLUYE: COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA EN DESPLANTE DE GUARNICIÓN.	M	354.95

3



C 12	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "L" DE 92 LT/M DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f'c=200$ KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACIÓN, SUMINISTRO DE BASE HIDRÁULICA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO.	M	3.16
C 13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO NORMAL $f'c=200$ KG/CM2, ACABADO PULIDO Y ESCOBILLADO FINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A BANCO DE TIRO.	M2	162.23

D

SEÑALAMIENTO VIAL

D 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-09 "LÍMITE MÁXIMO DE VELOCIDAD" DE 71x71 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	15.00
D 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-22 "PROHIBIDA LA ESTACIONAR" DE 71x71 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	18.00
D 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-24 "PROHIBIDA LA VUELTA A LA IZQUIERDA" DE 71x71 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	1.00
D 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-25 "PROHIBIDO EL RETORNO" DE 71x71 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS.	PZA	1.00
D 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SIS-19 "PARADA DE AUTOBÚS" DE 71x71 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS.	PZA	6.00
D 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-32 "PEATONES" DE 71x71 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN, TORNILLOS GALVANIZADOS ANTIVANDÁLICOS.	PZA	2.00
D 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-37 "SEMÁFORO" DE 71x71 CM Y SP-41 PLACA DE DISTANCIA "A 100 M" DE 71x30 CM, FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2 1/2" CAL. 14 DE ALTURA.	PZA	4.00



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA
CONTRATO NO. LP-MXL-REPUVE-002-2025 T-REPUVE-2024-05

D 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE OBSTÁCULO O BIFURCACIÓN DE 30x90 CM , FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA GAUGE 0.08", ACABADO REFLECTIVO SERIE T6500 AVERY, FRANJAS INCLINADAS BLANCO Y NEGRO. INCLUYE: POSTE CUADRADO GALVANIZADO DE 2" CAL. 14 DE ALTURA REQUERIDA PARA CUMPLIR ESPECIFICACIÓN.	PZA	10.00
D 10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-1 "RAYA SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRIL O ACOTAMIENTO O ESTACIONAMIENTO" DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	M	2,760.10
D 11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-7 "RAYA DE ALTO O DE PARADA" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA,	M	114.80
D 12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO TIPO M-8 "RAYA PARA CRUCE DE PEATONES" DE 40 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA,	M	719.55
D 13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO "RAYA PARA ZONA NEUTRAL O ISLETA (CEBREADO)" DE 20 CM DE ANCHO, CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS.	M	288.45
D 14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE FLECHAS O LEYENDAS , CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS.	PZA	71.00
D 15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE SÍMBOLO "XX Km/h" , CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA, APLICACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS.	PZA	32.00
D 16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE SÍMBOLO "WV" (PARADERO DE AUTOBÚS) , CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	PZA	6.00
D 17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL PAVIMENTO DE LEYENDA "BUS PRIORIDAD" (CARRIL PARA AUTOBÚS) , CON PINTURA TERMOPLÁSTICA COLOR AMARILLA O BLANCA.	PZA	22.00
D 18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETAS PROVISIONALES PARA CARPETA ASFÁLTICA COLOR AMARILLO, AUTOADHERENTES CON FRANJA REFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO.	PZA	373.00
D 19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE UNA CARA REFLEJANTE DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	1,304.00
D 20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA MARCA ENNIS-FLINT STIMSONITE MODELO C80 DE DOS CARAS REFLEJANTES DE 11.6x8.1x1.8 CM, DE 71 GRAMOS, COLOR BLANCO O AMARILLO.	PZA	235.00
D 21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTOPEROL COLOR BLANCO O AMARILLO , FIJADO CON PEGAMENTO EPÓXICO Y/O BITUMINOSO. INCLUYE: TRAZO, PREMARCADO, BARRIDO DE POLVO.	PZA	1,945.00
E SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA			
E 01	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE DELINEADOR DE PLÁSTICO FLUORESCENTE DE 1.05 M DE ALTO, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO.	PZA/SEM	394.98

5



E 02	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE CINTA DE HULE AMARILLA PARA DELIMITACIÓN DE CARRIL Y ZONA DE TRABAJO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	M/SEM	2,042.15
E 03	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE 1.78x0.55 M CON LEYENDAS, BASE METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA DE 0.080" DE ESPESOR, EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	PZA/SEM	70.28
E 04	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN EN OBRAS DE 0.86x0.86 M CON LEYENDAS, BASE METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA DE 0.080" DE ESPESOR.	PZA/SEM	23.42
E 05	RENTA POR SEMANA (24 HR/DÍA) DE TRAFITAMBOS DE PLÁSTICO DE 1.05 M DE ALTO, COLOR NARANJA, CON FRANJAS REFLEJANTES DE ALTA INTENSIDAD Y BASE PARA PAVIMENTO.	PZA/SEM	5.29
E 06	RENTA POR JORNADA (24 HR/DÍA) DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE FLECHA SECUENCIAL DE 25 LUCES, EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA SEÑALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DEL FLUJO VEHICULAR SOBRE LA VIALIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	JORNADA	50.00

III.- RELACION DE ESTIMACIONES:

No. DE ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	IMPORTE TOTAL CON IVA
1	14 DE ABRIL DEL 2025 AL 06 DE MAYO DEL 2025	\$ 6,690,566.59	\$ 1,070,490.65	\$ 7,761,057.24
2	07 DE MAYO DEL 2025 AL 24 DE MAYO DEL 2025	\$ 6,314,674.52	\$ 1,010,347.93	\$ 7,325,022.45
3	25 DE MAYO DEL 2025 AL 23 DE JUNIO DE 2025	\$ 750,199.82	\$ 120,031.97	\$ 870,231.79
4(FINIQUITO)	24 DE JUNIO DEL 2025 AL 04 DE JULIO DEL 2025	\$ 1,329,055.49	\$ 212,648.88	\$ 1,541,704.37
	TOTAL	\$15,084,496.42	\$2,413,519.43	\$17,498,015.85

En este acto, el L.A.E. Víctor Samuel Aceves Orozco Representante Legal de la empresa Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V., responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de obra de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada, según lo establecido en el Artículo 166, fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Así mismo, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el último párrafo del Artículo 166 de su Reglamento en vigor, el contratista hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere

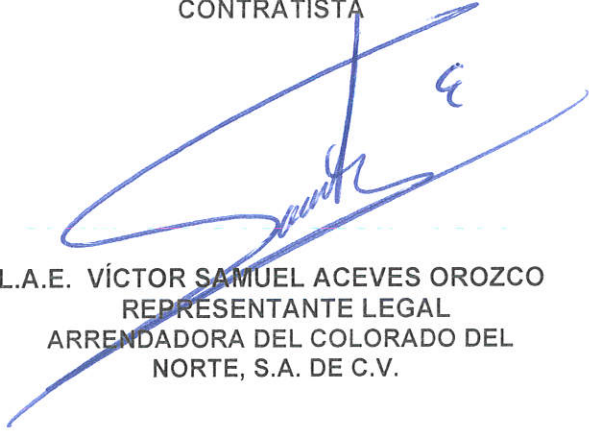


incurrido, mediante la fianza No. 2352966 emitida por Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.,

En vista de lo anteriormente consignado, el **L.A.E. Víctor Samuel Aceves Orozco**, Representante Legal de la empresa **Arrendadora del Colorado del Norte, S.A. de C.V.**, hace entrega al **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 11:00 hrs. del día **14 de julio de 2025**.

CONTRATISTA


L.A.E. VÍCTOR SAMUEL ACEVES OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL
ARRENDADORA DEL COLORADO DEL
NORTE, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. ALBERTO IBARRA OJEDA
DIRECTOR

TESTIGO


ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN
JEFE DEL DEPTO. DE EJECUCION Y CONTROL DE
OBRA VIAL

TESTIGO


ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES
RESIDENTE DE OBRA
